

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0043-200203-05 Datum van het onderzoek : 03/02/20
Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : IMMO NV
MELDE 5
2930 BRASSCHAAT

EIGENAAR : IMMO NV
Adres : PAALSTRAAT 70
2900 SCHOTEN

OPDRACHTGEVER : MATHI
Adres : LUYCKSTRAAT 6A
2960 BRECHT

INSTALLATEUR : MATHI
Adres : LUYCKSTRAAT 6A
2960 BRECHT

BTW of IK : BE0479.640.749.

Visualisatie van de installatie



EAN : **Teller nr.** 571114. **Index :** 96457,8 kWh.

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Uitbreiding / Wijziging /	Type der Lokalen :	Woning.
Begin werken fundering:	Na 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	Mono 230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	2 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	G2/40 A
Type van de aardelektrode:	Lus	Alg. schakelaar: type :	2p 40A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	13
Uitwendige invloedsfactoren :	N.v.t.	Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270, AREI art. 271,

VMA - 48.5

MA-LS-02/2015



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek en Controle bezoek

METINGEN:

RA: 5 Ohm RI tot 100 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadschema en situatieschema.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

- 1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.

BESLUIT

De installatie is conform.

De ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 03.02.2045 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0043 KURT VAN ASCH

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstrom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

VMA - 48.5

Verslagnummer 0043-200203-05



2 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2


Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

STAP 3


Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 03.02.2045.

STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

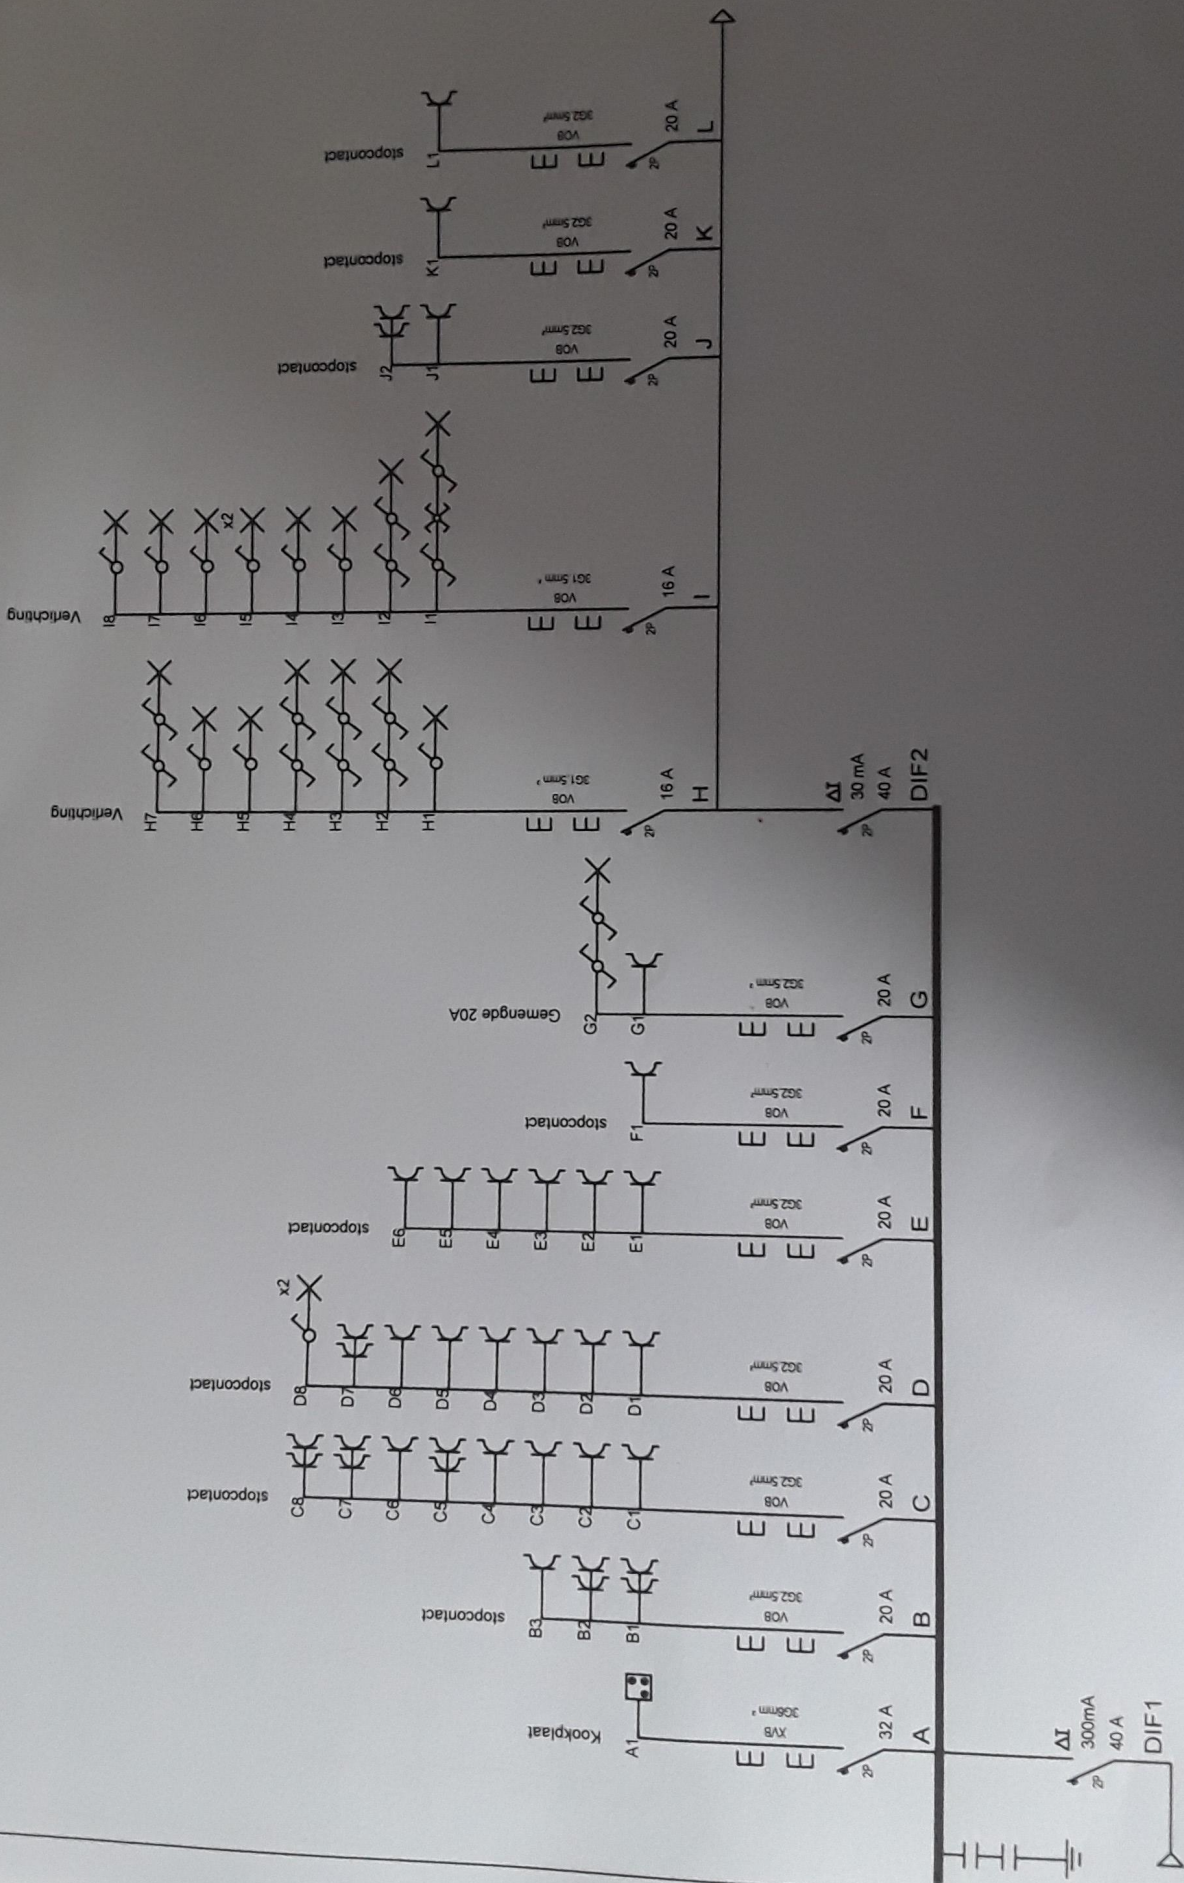

INSTALLATEUR		KEURING	WERF	Schema1A	230 V
Naam	Mathi NV	ORGANIS.	Naam	brasschaat Melde 5	
BTW	.BE 0479 640 746	Naam	Staat	.Melde 5	
Datum	02/02/2020	Datum	Gemeen	.Brasschaat	
Handte	Mathi Erik	Handte	Handte		



230 V

Schema 1B

WERF

Naam
Straat
Gemeente
Handtekening

brasschaat Melde 5
Melde 5
Brasschaat

KEURING


ORGANIS.
Naam
Datum
Handtekening

BTW
Kurt Van Asch
03/02/2020

INSTALLATEUR

Naam
BTW
Datum
Handtekening

Mathi NV
BE 0479 640 749
02/02/2020
Marten Erik

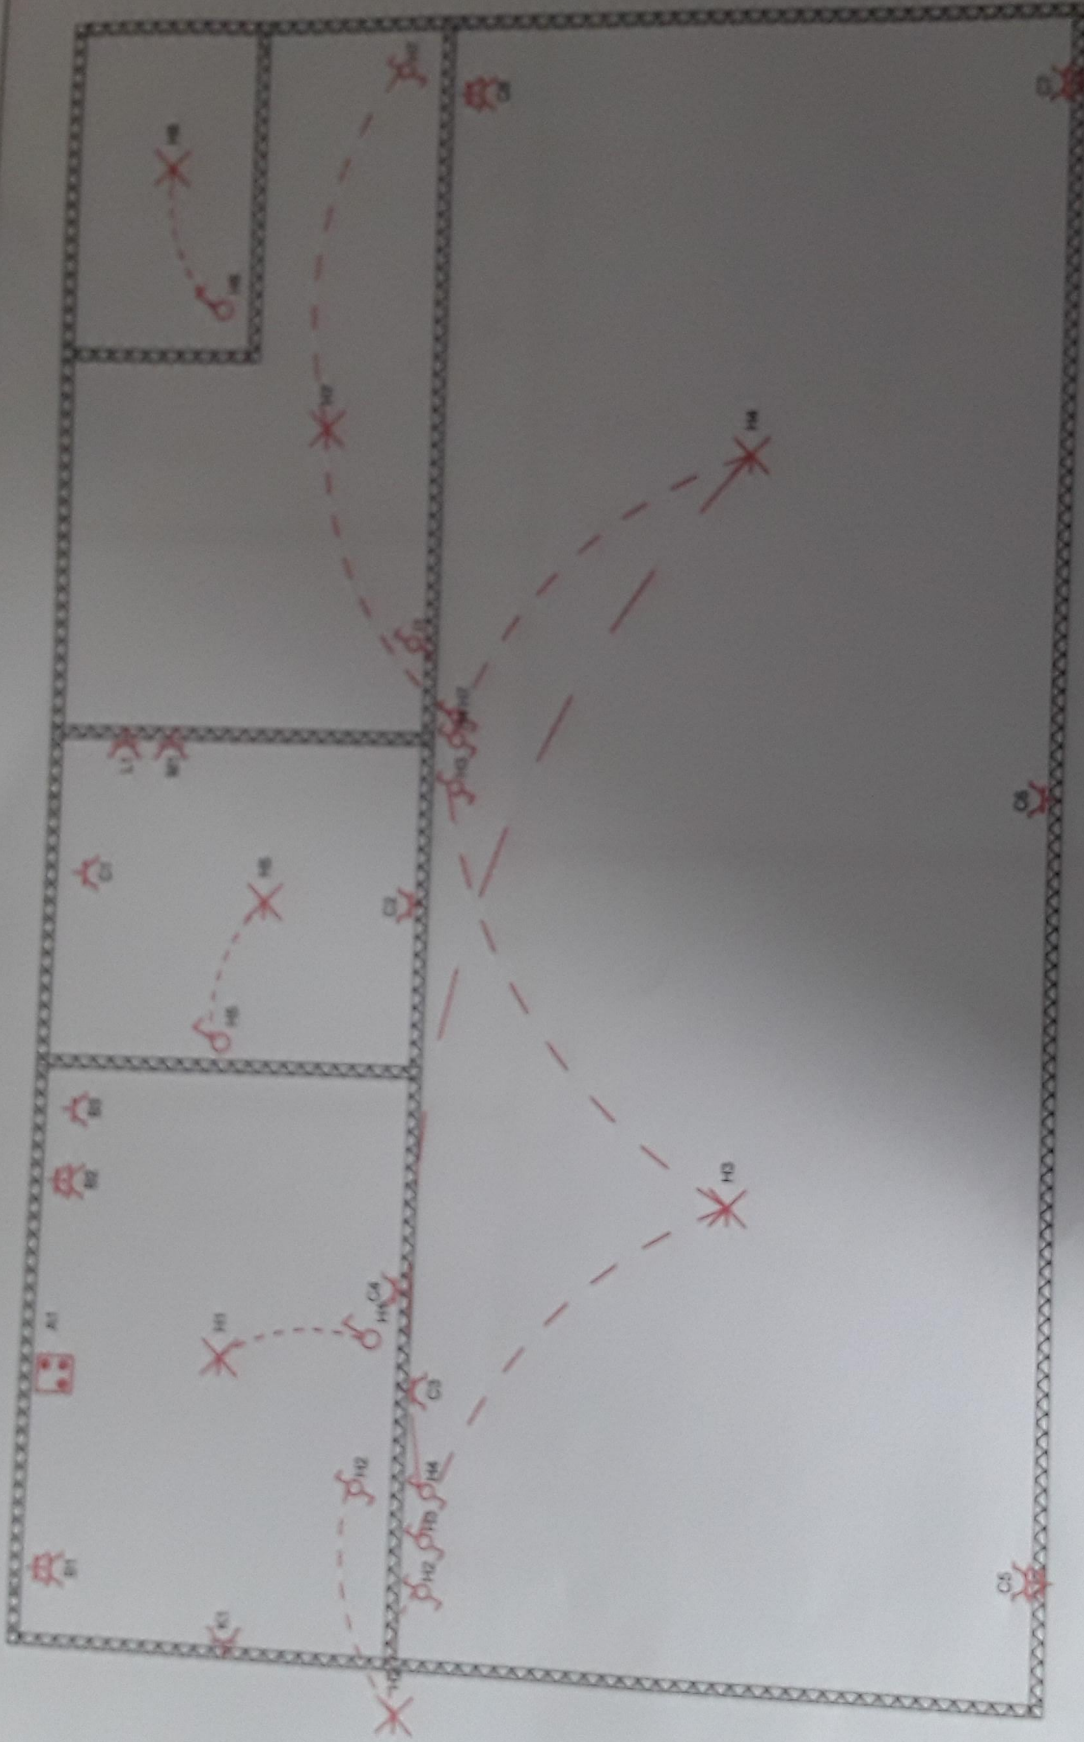

INSTALLATEUR

Naam Mathi NV
 BTW BE 0479 660 240
 Datum 20/07/2023
 Handtekening Mathi NV

KEURING


ORGANIS BV
 Naam Kees van der
 Datum 03/08/2023
 Handtekening Kees van der

WERF

Naam
 Straat
 Gemeente
 Handtekening

Braaschaat Meisje 3
 Meisje 5
 Braaschaat

230 V

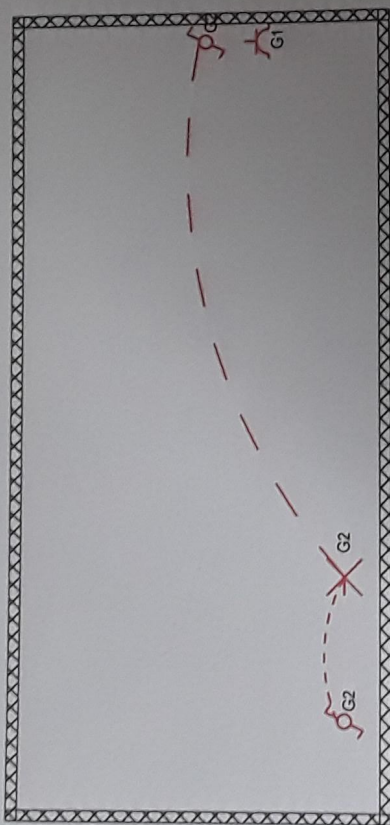

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		garage		230 V	
Naam Mathi NV BTW BE 0479 649 7149 Datum 02/02/2020 Handtekening <i>[Signature]</i>		ORGANIS BTV Naam Kurt Van Asch Datum 03/02/2020 Handtekening <i>[Signature]</i>		Naam Straat Gemeen Handtekening <i>[Signature]</i>		brasschaat Melde 5 Melde 5 Brasschaat			
